

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 года**

АО "Шығыс Жылу". Вид деятельности: Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией. Инвестиционная программа на период с 1 февраля 2021 года по 31 января 2026 года утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО №197-ОД от 24 декабря 2020 года и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО №113 от 24 декабря 2020 года.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

p/c №	Оперативная информация о реализации инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 г. в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
	Ис-шаралар атауы	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства		Бюджетные средства		Деятельность, не относящаяся к регулируемым услугам	
			план	факт	план на год	факт за 1 полугодие	план на год	факт за 1 полугодие	отклонение от плана на год	причины отклонения	план на год	факт за 1 полугодие	план на год	факт за 1 полугодие	план на год	факт за 1 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с 1.02.2025г. по 31.01.2026г.				2 279 354	196 497	2 279 354	196 497	-2 082 857	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч.															
	1 Реконструкция, модернизация или ремонт существующих тепловых сетей, оборудования и сооружений на них				1 489 228	75 000	1 489 228	75 000	-1 414 228	Исполнение мероприятий согласно графиков работ и плана госзакупок						
	2 Реконструкция, модернизация и ремонт котельного оборудования и технологических процессов				463 916	76 094	463 916	76 094	-387 822							
	3 Реконструкция, модернизация или ремонт существующих зданий и сооружений				59 584	6 767	59 584	6 767	-52 817							
	4 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду				96 358	0	96 358	0	-96 358							
	5 Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности				86 815	0	86 815	0	-86 815							
	6 Ремонт электроснабжения производственных объектов				71 032	13 550	71 032	13 550	-57 482							
	7 Замена устаревшего, ремонт и приобретение нового оборудования				1 666	2 589	1 666	2 589	923							
	8 Обновление средств информационных технологий при осуществлении Государственной программы «Цифровой Казахстан»				10 755	22 497	10 755	22 497	11 742							
	Мероприятия ИП на период с 01.02.2024г. по 31.01.2025г., сроки исполнения которых перенесены на период с 01.02.2025г. по 31.01.2026г.				74 506	46 096	74 506	46 096	-28 410							

Капитальные ремонты тепловых сетей

Ремонт тепловой сети от ТК-862 до ТУУ ул.Маяковского 6,4, ТУУ ул Калихан Ыскак 15, ТУУ ул Бульвар Гагарина 27, ТК-862-14, от ТК-863 по подвалу ж.д. ул.Маяковского 6

В рамках данного ремонта производится замена участка тепловой сети диаметрами 57, 89, 108, 219 и 273 мм и протяженностью 0,781 км канала



Ремонт надземной тепловой сети от ТК - 606/4 до УТ 5 пр. К. Сатпаева



В рамках данного ремонта производится замена участка тепловой сети диаметром 159 мм и протяженностью 0,301 км канала



Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 ст. №5 котельной № 2



Ремонт котлоагрегата КЕВ-25-14С-150 ст. №4 котельной № 3

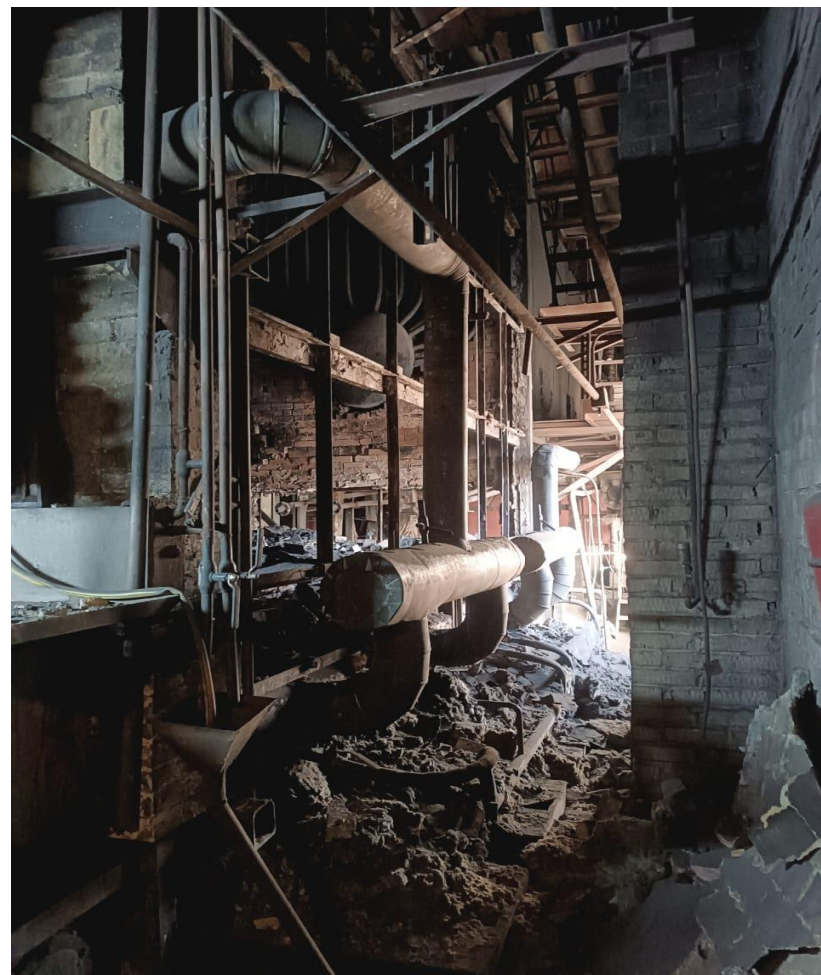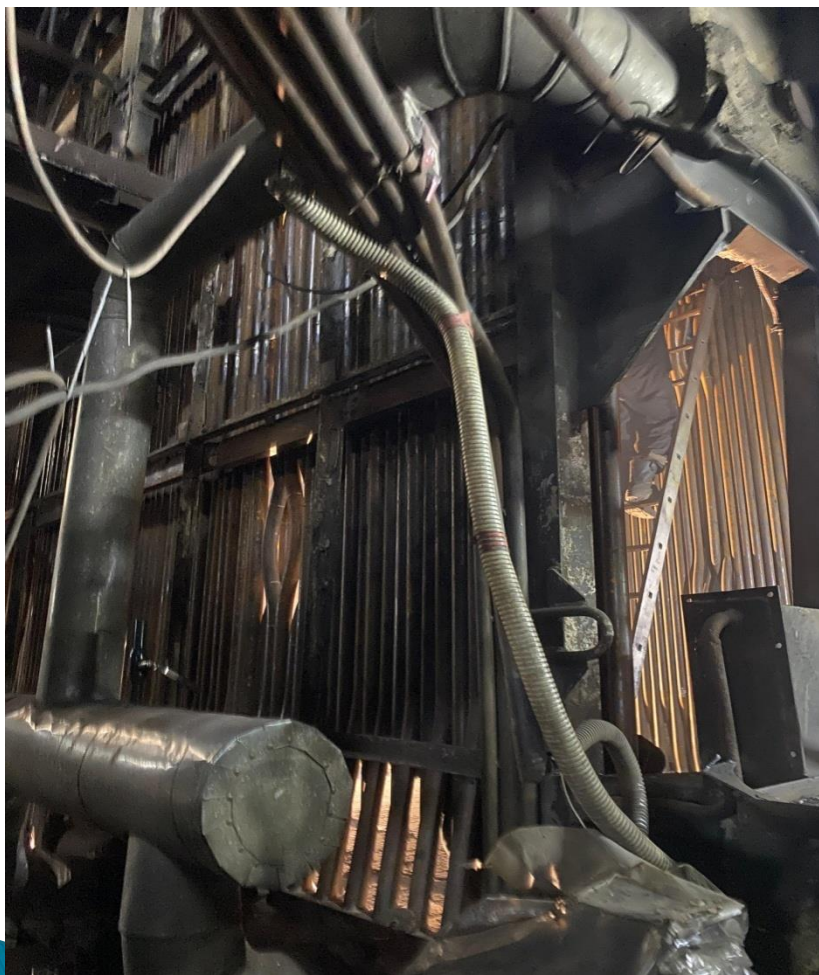

Ремонт оборудования котлоагрегата Е-50-14 стационарный № 2 котельной № 2 (заднего экрана, вспомогательного оборудования)





НАСОС ГНОМ 16-16 220В



КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ BERG
18,5 кВт



Насос ЦНСТ-38-220



Насос K100-65-250



Hacoc BKC 2-26K



Частотный преобразователь 315 кВт



Радиостанция стационарная с дисплеем,
400-470 МГц, 45 Вт



СЕПАРАТОР МАГНИТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ СМП-М-900



Сервер



Ноутбук



Многофункциональное устройство



МОНИТОР 27" SAMSUNG, 24шт.



КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ, 28шт.
